


Перечень Оборудования поставляемого Подрядчиком

№ п/п	Наименование МТР	Единица измерения	Кол-во
Строительство БКТП - 2 x 1000кВА мкр. 31Б с КЛ-10кВ			
1	Монтаж оборудования БКТП - 2x1000кВА мкр. 31Б		
1.1	2БКТП-1000/10 (с трансформаторами 1000кВА)	комплект	1

Согласовано

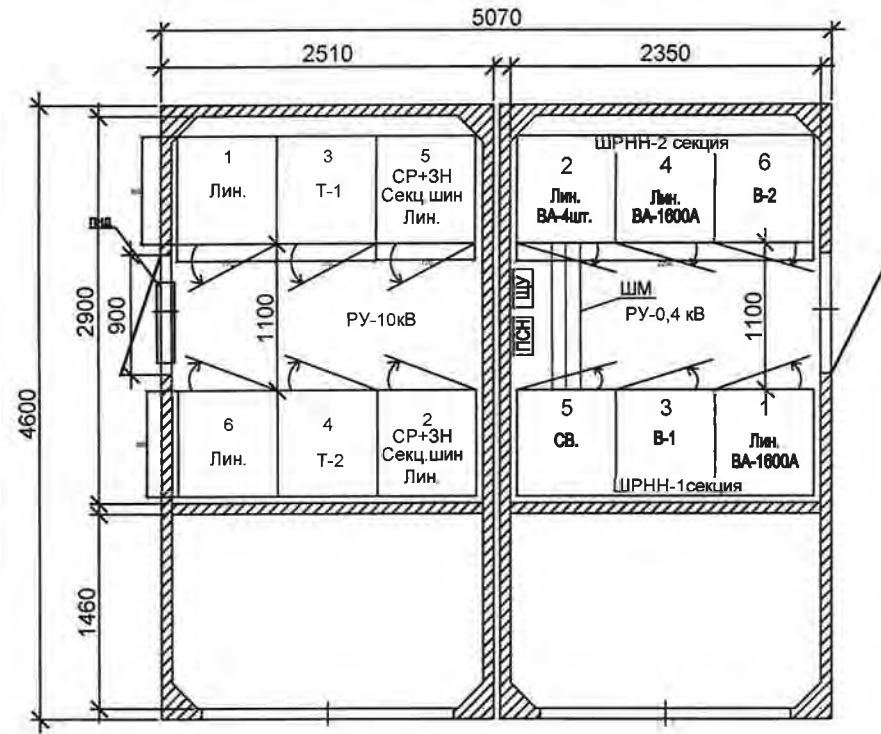


Инв. № подл.	В заклад	Погр. и дата	Взам. инв.
			№

Примечание (окончание РУ-0,4кВ):
 9. Внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;
 10. Контрольная сборка и испытания РУНН с монтажом ошиновки **ОБЯЗАТЕЛЬНА!**
 11. Предусмотреть на все входные двери БКТП знак "Осторожно! Электрическое напряжение!" ГОСТ 12 4 026-76 (знак №2 5);
 12. Монтаж токовых цепей выполнить согласно ПУЭ 3.4.3, 3 4.23, 1 7 46, ПТЭЭП 2 6.24
 13. Предусмотреть монтаж нулевой шины в линейных панелях ближе к коридору обслуживания
 14. Предусмотреть расположение ВА 250А вверху панели, ВА 400А внизу
 15. Предусмотреть ошиновку от Т-2 до панели В-2 шиной АД31Т120х10 в разборном коробе по всей длине;
 16. Двери КСО и ШРНН открываться в сторону выхода, как показано на плане.

Изм.	Код уч.	Лист N док.	Погр.	Дата
Разработал	Фаттахова			07.15
Проверил	Ходина			07.15
Проверил	Ахметгалин			07.15
Проверил	Щербаков			07.15
Проверил	Иванов			07.15
Проверил	Голубков			07.15
Утвердил	Григорьев			07.15

07/15-044-ОЛ			
2БКТП-10/0,4 - 1000кВА ООО "МЭТРО Кэш энд Керри"			
Строительство 2БКТП-1000 кВА 10/0,4кВ	Стадия	Лист	Листов
	П	4	6
План расположения оборудования		ООО "СГЭС"	

Согласовано

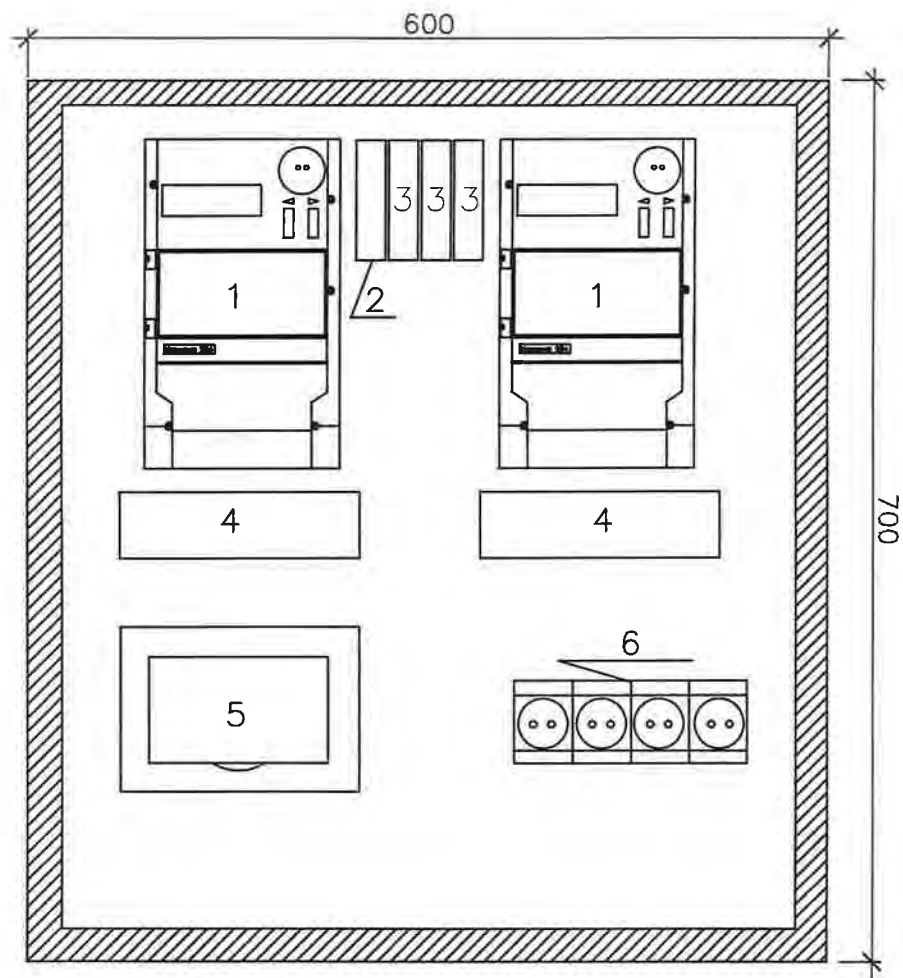

Примечание:

Укомплектовать ЩУ-1 (600x700x200):

1. Электросчетчик-Меркурий 234 ARTM-03PB.L2 - 2шт;
2. GSM шлюз- Меркурий 228 - 1шт;
3. Концентратор-Меркурий 225.21 - 3шт;
4. Коробка испытательная переходная - 2шт;
5. Фильтр подключения -1шт;
6. Розетка - 4шт;
7. Кабель КВВГ-10x2,5 (от тр-ров тока до ЩУ-2) - 40м ;
8. Провод ПВ 1x2,5 (внутр. разводка в ЩУ-2) - 15м .

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. В заказе

03/15-12-ОЛ

Щит учет лектроэнергии (ЩУ-2)

Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата
Разработал	Фаттахова			<i>Фаттахова</i>	04.15
Проверил	Ходина			<i>Ходина</i>	04.15
Проверил	Щербаков			<i>Щербаков</i>	04.15
Проверил	Голубков			<i>Голубков</i>	04.15
Утвердил	Григорьев			<i>Григорьев</i>	04.15

Щит учета с двумя счетчиками трансформаторного включения

Стадия Лист Листов

П 6 6

Расположение оборудования

ООО "СГЭС"
